KEBG_Kita Ev. Brüdergemeine
Donaustraße 66, 12043 Berlin

Bauablaufplan

LKK | Architekt:innen
Lehrecke
Kammerer
Keiß
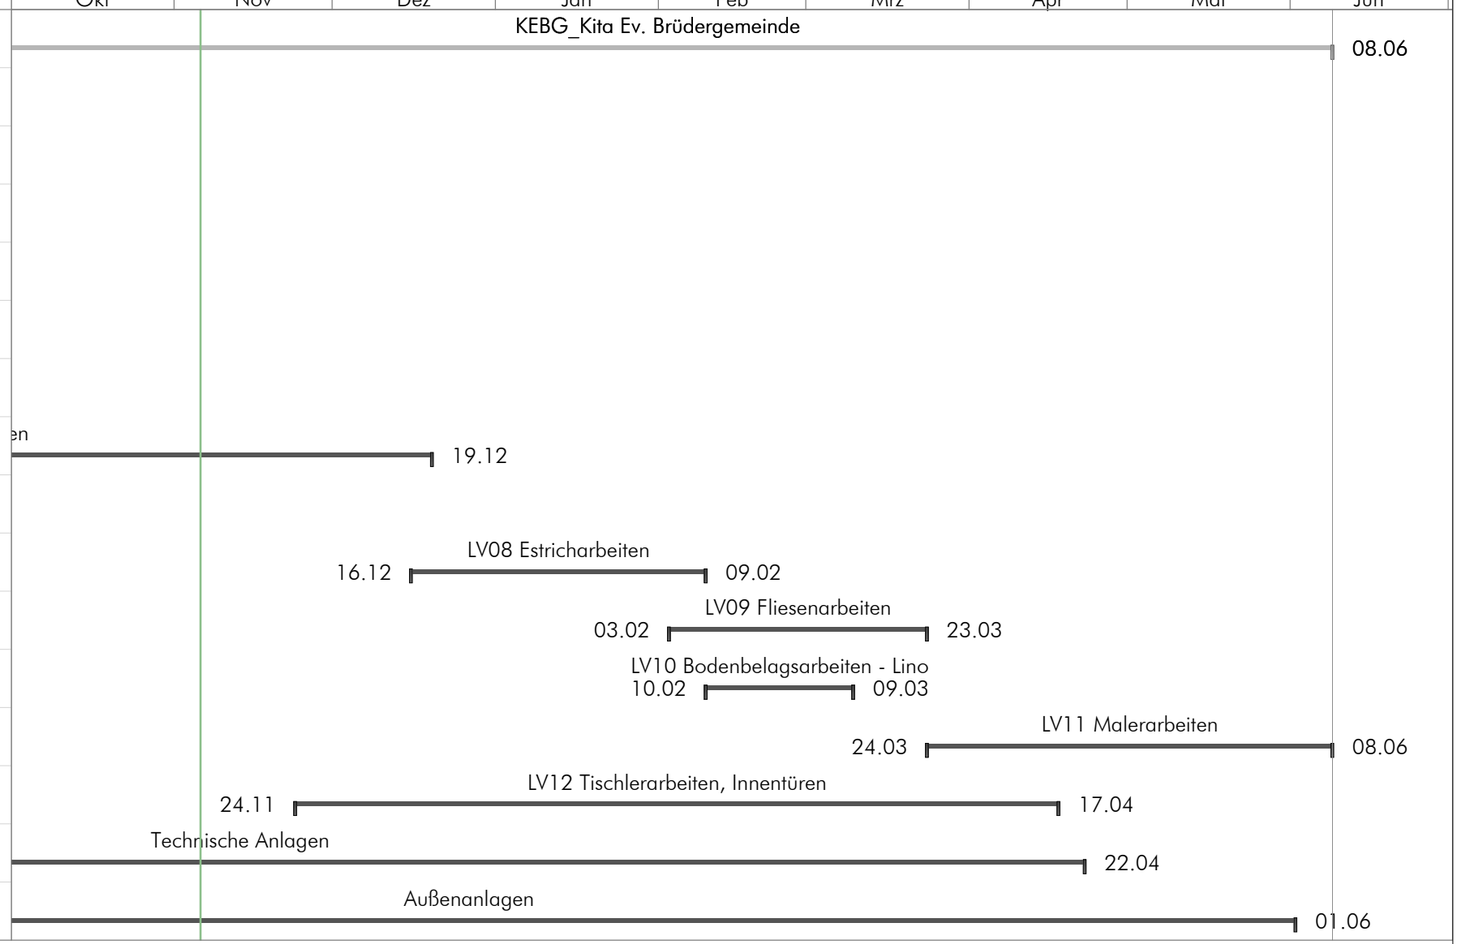
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
0	KEBG_Kita Ev. Brüdergemeinde	409 Tage	Mon 21.10.24	Mon 08.06.26
1	LV01 Schadstoffsanierung und Rückbau	118 Tage	Die 19.11.24	Mit 07.05.25
8	LV04 Rohbauarbeiten	57 Tage	Mon 24.03.25	Mit 18.06.25
16	LV03 Zimmer- und Holzbauarbeiten	153 Tage	Mon 21.10.24	Mit 28.05.25
29	LV02 Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten	44 Tage	Mon 05.05.25	Die 08.07.25
34	LV14 Metallbauarbeiten	15 Tage	Mon 05.05.25	Mon 26.05.25
37	LV05 Fenster, Außentüren, Sonnenschutz	76 Tage	Die 18.02.25	Mit 11.06.25
43	LV07 Trockenbauarbeiten	139 Tage	Fre 06.06.25	Fre 19.12.25
47	LV06 Innenputz	15 Tage	Mon 16.06.25	Fre 04.07.25
49	LV08 Estricharbeiten	36 Tage	Die 16.12.25	Mon 09.02.26
55	LV09 Fliesenarbeiten	35 Tage	Die 03.02.26	Mon 23.03.26
59	LV10 Bodenbelagsarbeiten - Lino	20 Tage	Die 10.02.26	Mon 09.03.26
62	LV11 Malerarbeiten	50 Tage	Die 24.03.26	Mon 08.06.26
65	LV12 Tischlerarbeiten, Innentüren	99 Tage	Mon 24.11.25	Fre 17.04.26
69	Technische Anlagen	221 Tage	Fre 06.06.25	Mit 22.04.26
90	Außenanlagen	214 Tage	Mit 23.07.25	Mon 01.06.26
